


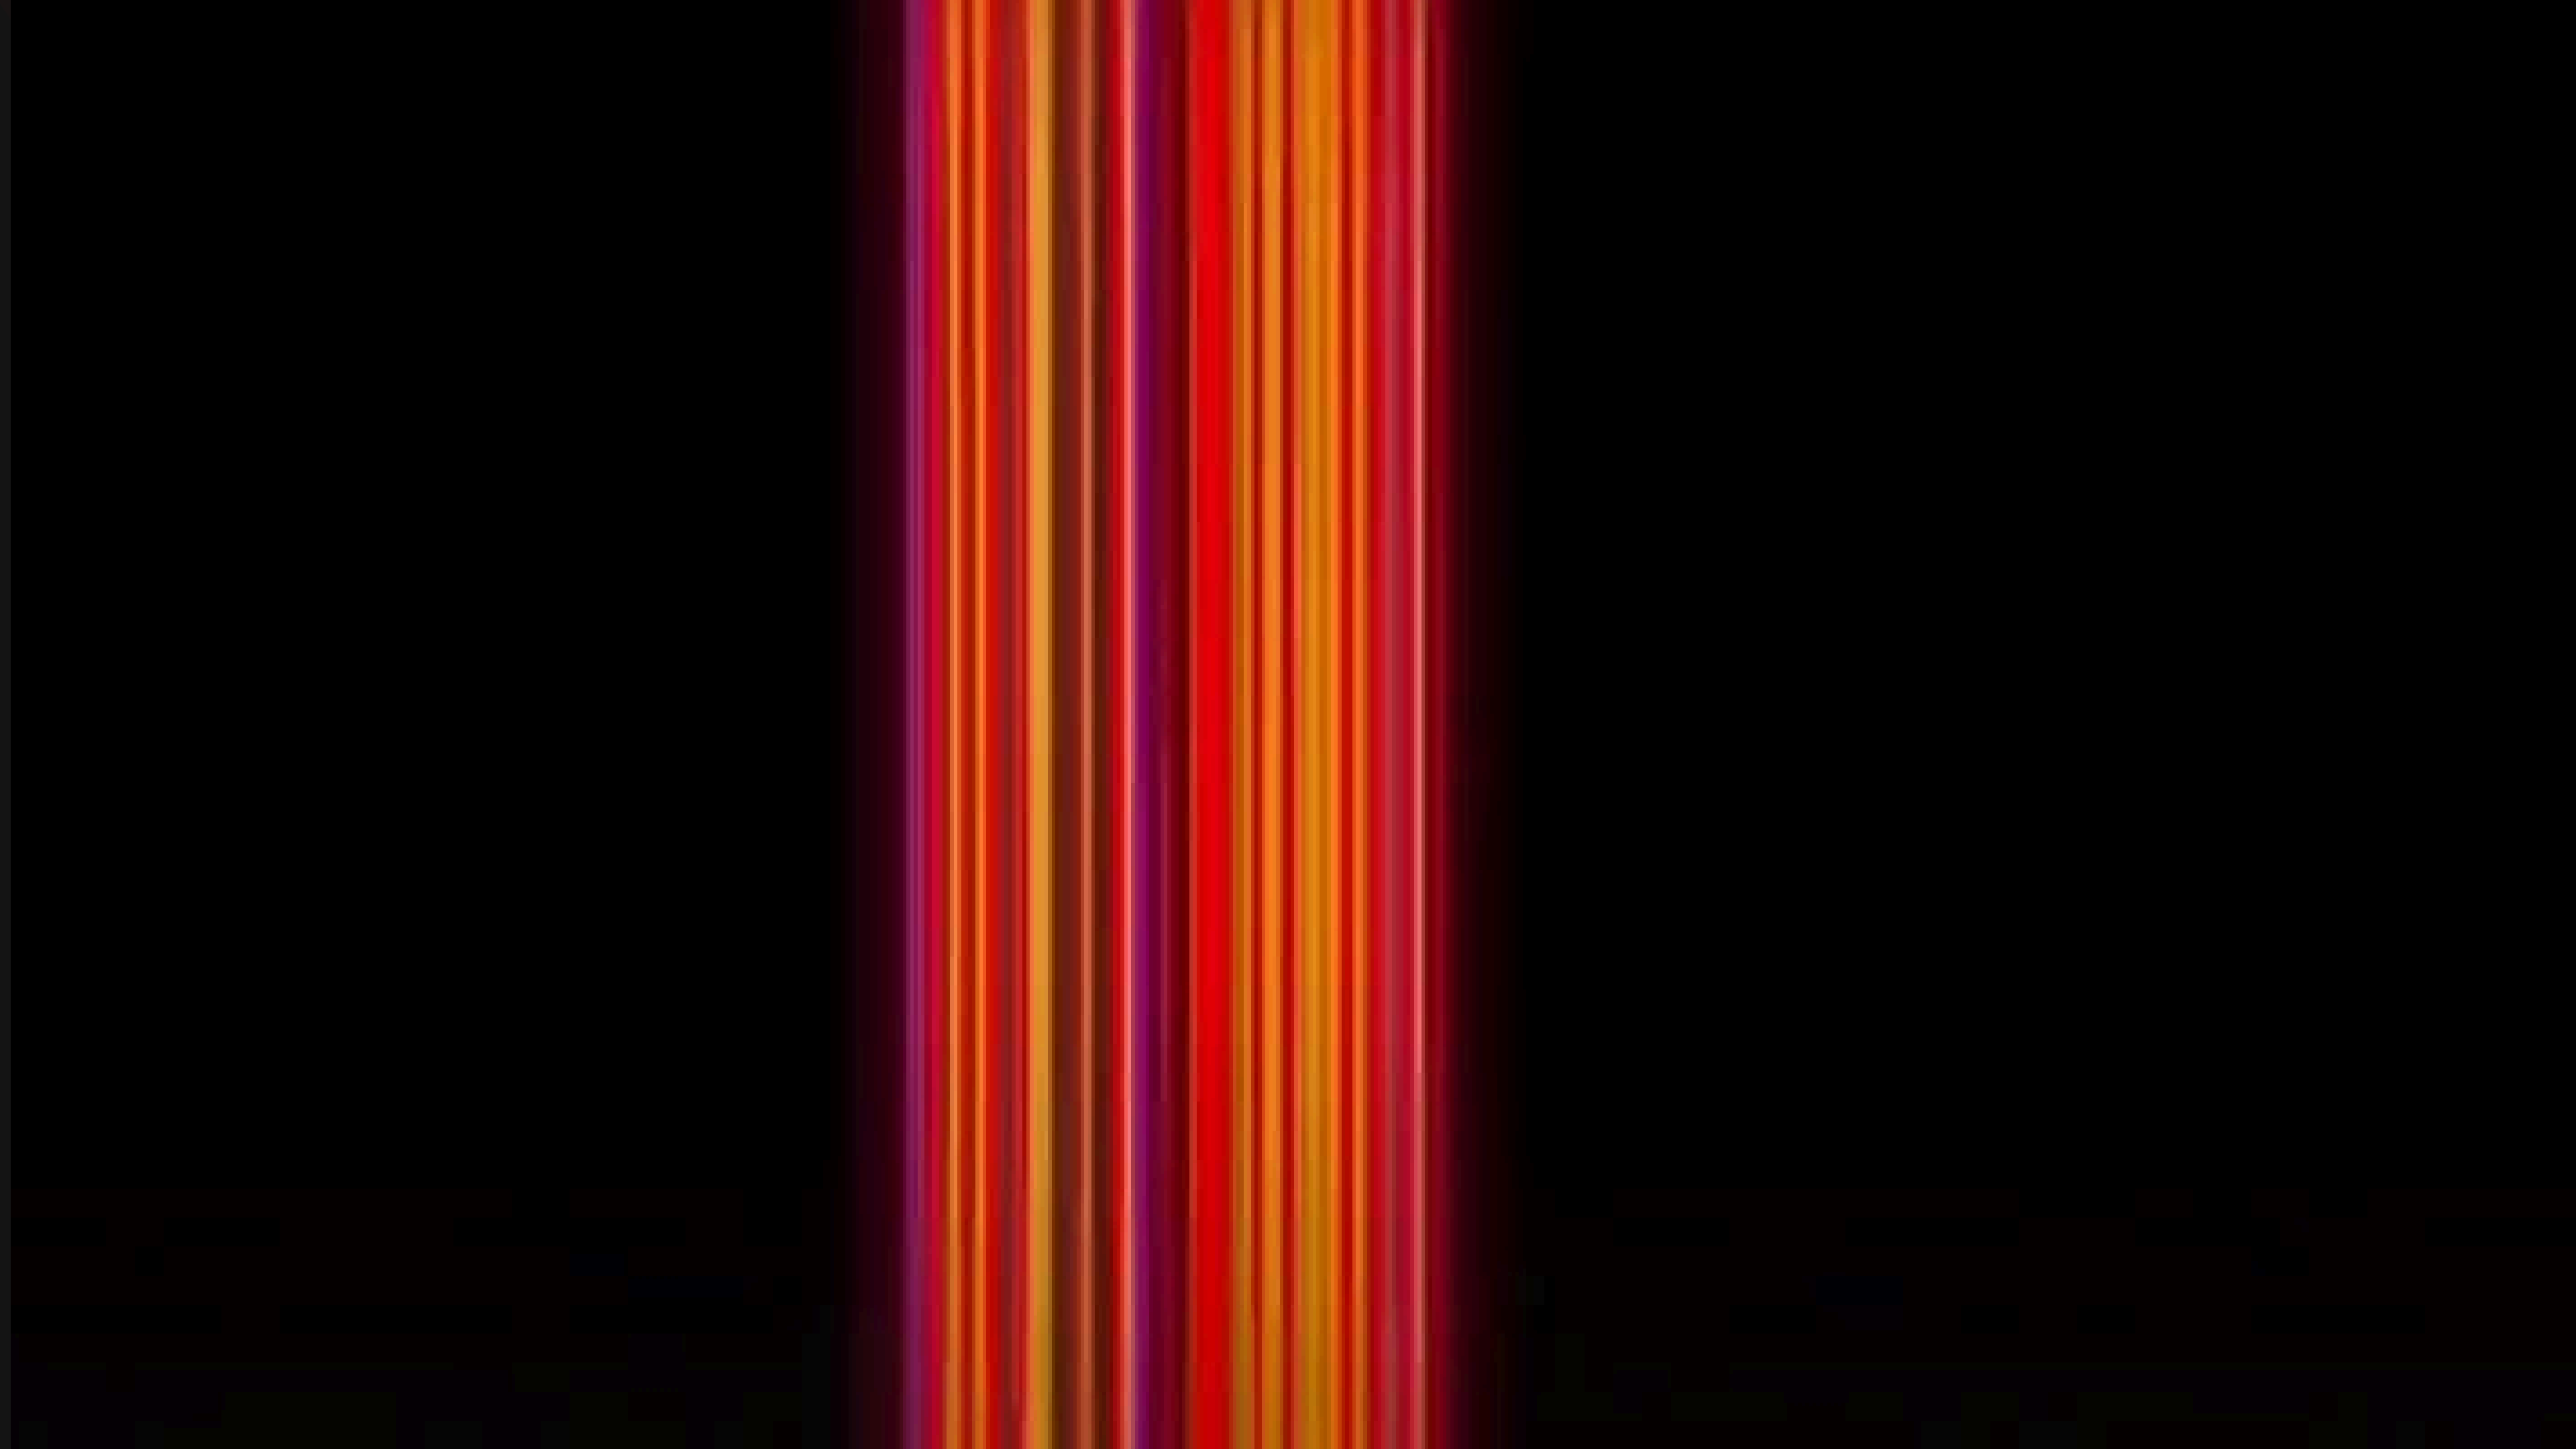

SOPPO
MARION

DEFFO
FRANCK


BATINA
EMMANUELLA

WAGNA
PATRICK

ODOULAMI
PHILIPPE

Projet Netflix


Exposé de méthode Agile

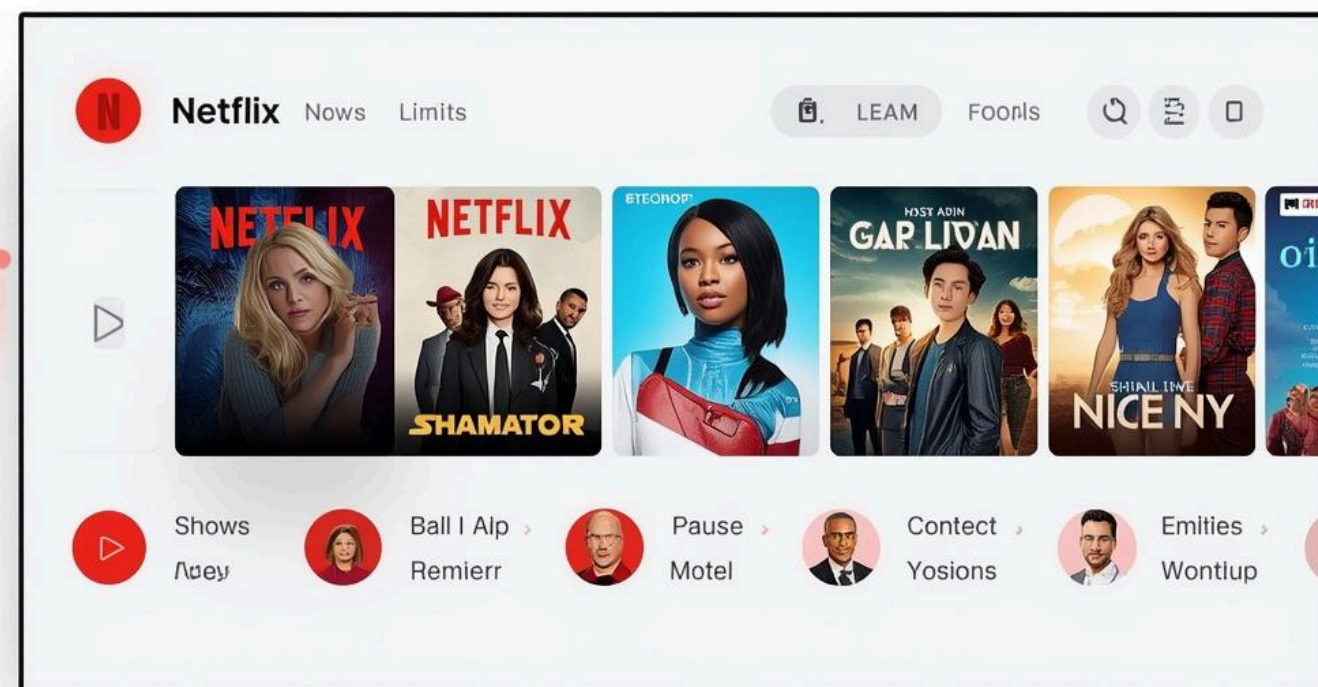

GROUPE 2

Sommaire


- 01 Introduction
- 02 Présentation de l'application
- 03 Partie Jira
- 04 Partie Gantt
- 05 Analyse comparative
- 06 Fonctionnalités liées à notre spécialité et améliorations
- 07 Conclusion

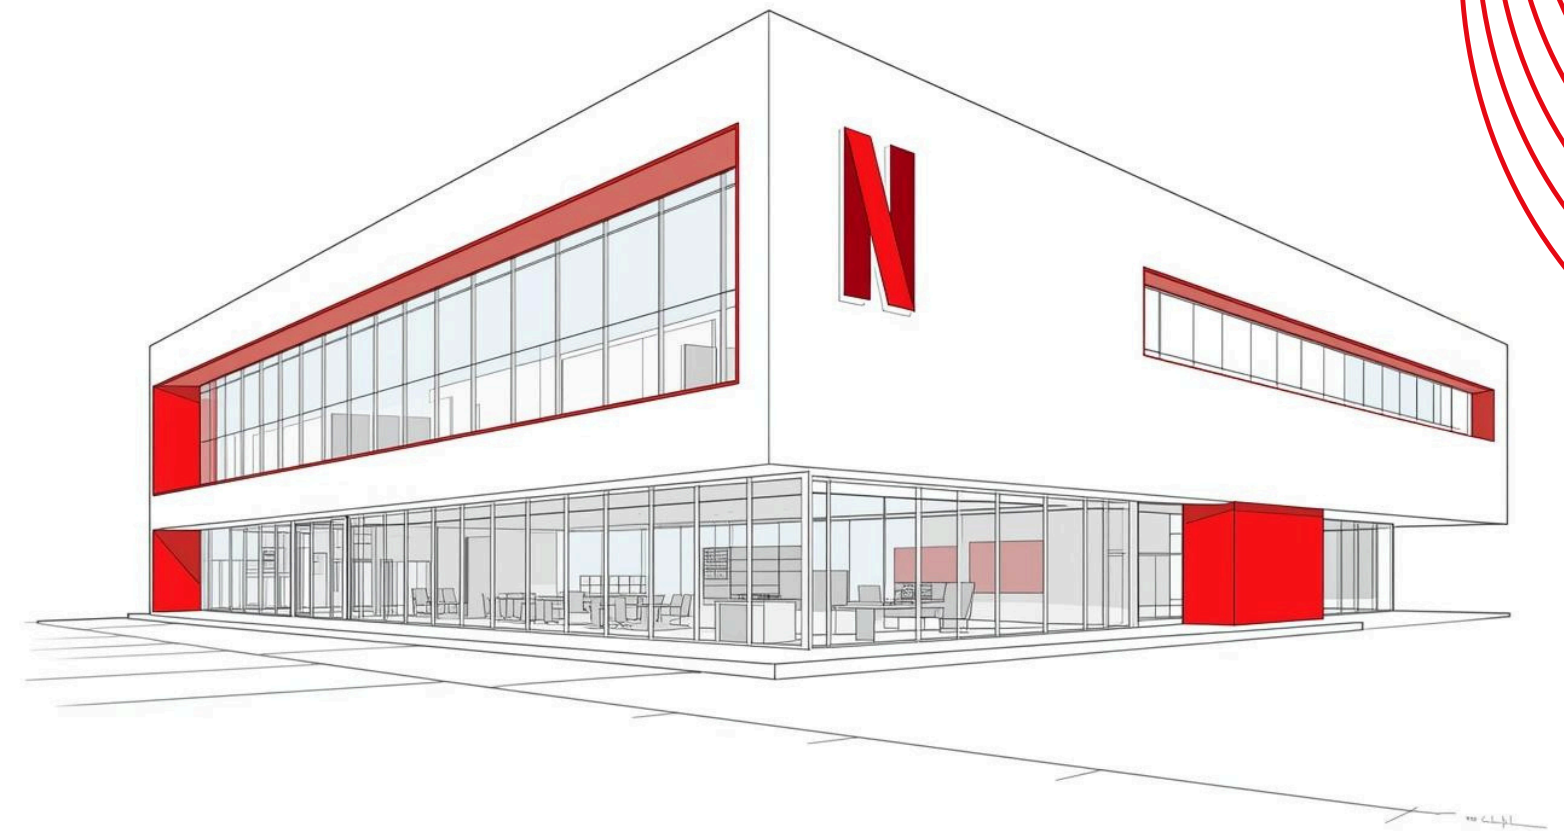



INTRODUCTION

Netflix est aujourd'hui le leader mondial du streaming, son succès repose sur sa capacité à s'adapter rapidement aux besoins des utilisateurs. Autrefois, les entreprises privilégiaient des méthodes classiques comme le modèle en cascade (Waterfall), mais l'ascension de la méthode agile a permis de découper les projets en cycles courts, essentiels dans le cas de Netflix. Nous nous intéressons donc à la gestion de projet chez Netflix à travers l'agile avec l'outil Jira, tout en visualisant la méthode classique via l'outil Gantt.

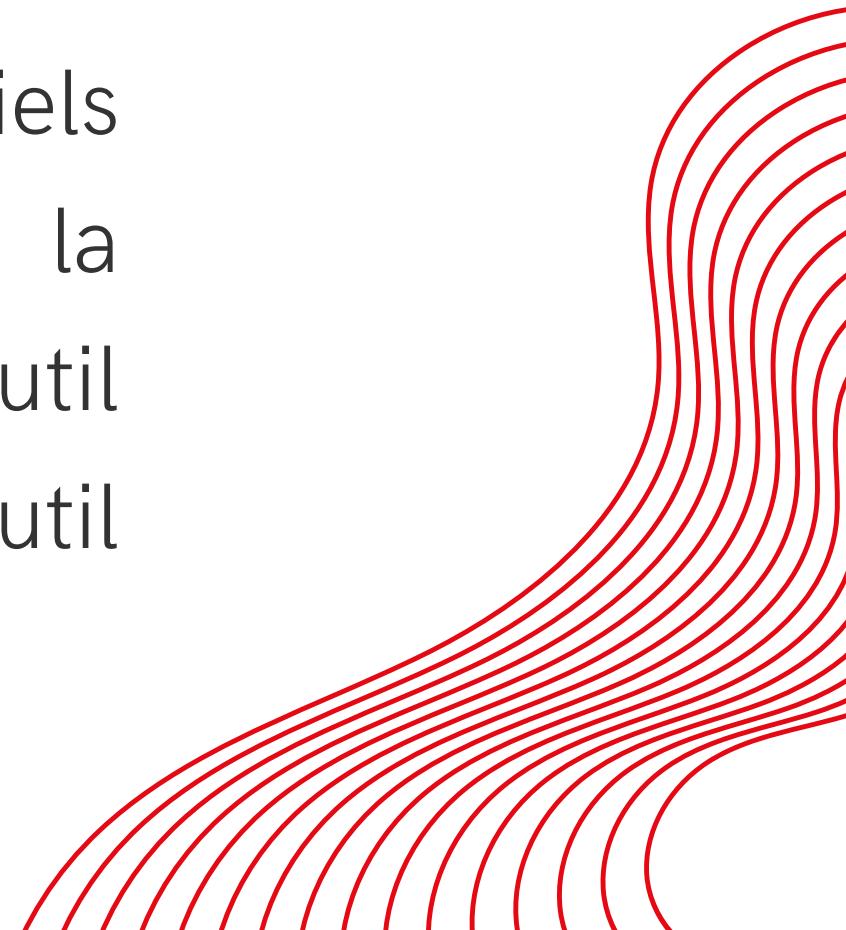

PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

La plateforme Netflix , lancé en 2007 est un service de vidéo à la demande par abonnement qui gère la distribution d'un grand nombre de films et de séries télévisées ainsi que la création d'originales oeuvres .


Fonctionnalités du MVP de Netflix

- Authentification
- Catalogue minimal
- Recherche
- Lecteur vidéo basique
- Paiement simple




PARTIE JIRA

Le projet est structuré dans Jira afin d'assurer un suivi agile et transparent

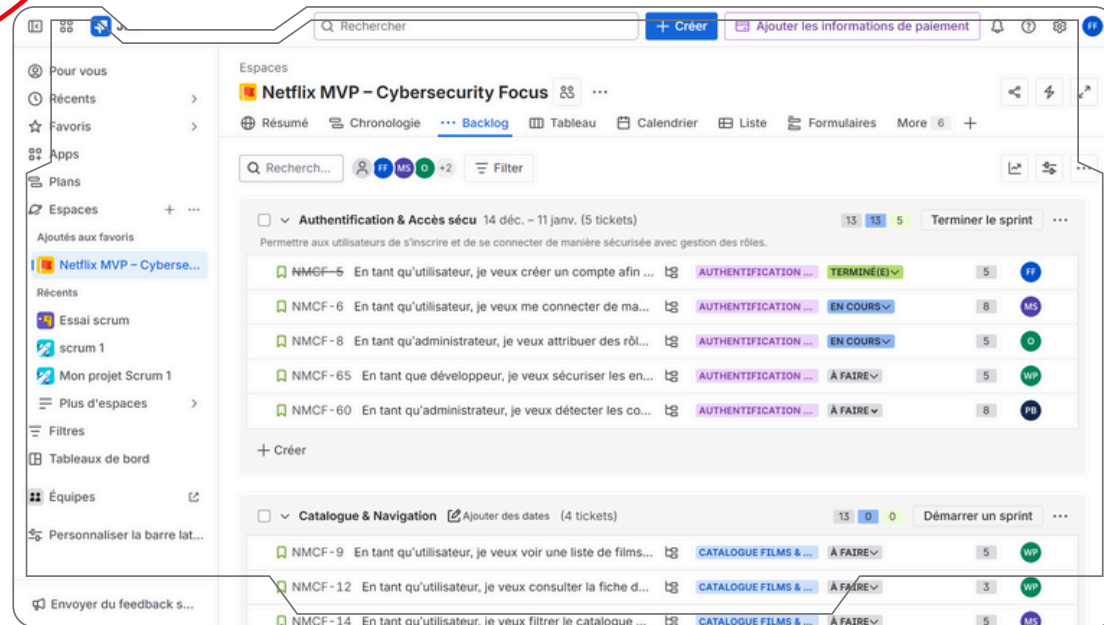


Epics

six grands blocs fonctionnels du MVP constituent nos épics. L'authentification, le catalogue, la recherche, lecture vidéo, paiement, recommandations)

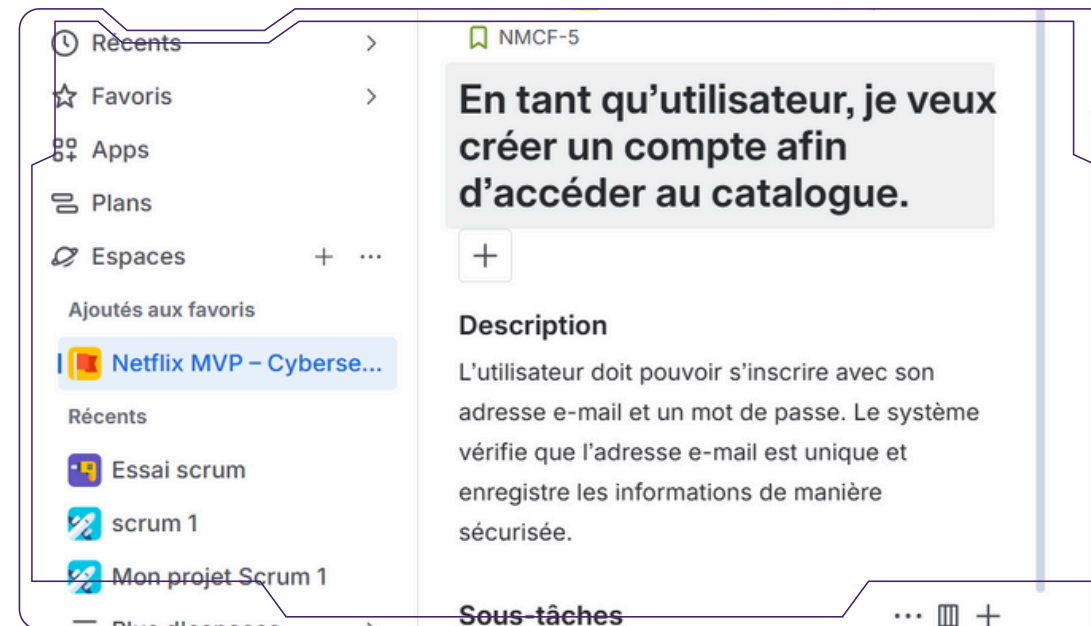


User Story

besoins utilisateurs formulés selon les standards Scrum, estimés en Story Points et rattachés aux Epics

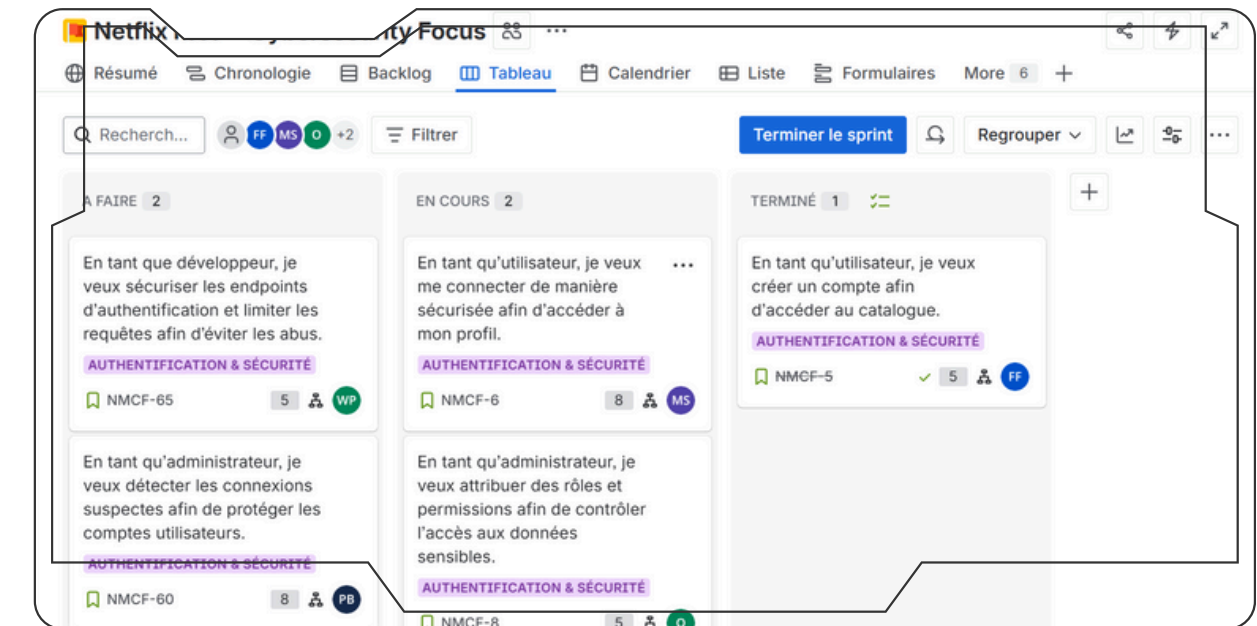

Sprint Board

suivi visuel de l'avancement (À FAIRE / EN COURS / TERMINÉ), garantissant la traçabilité et la progression des livrables.

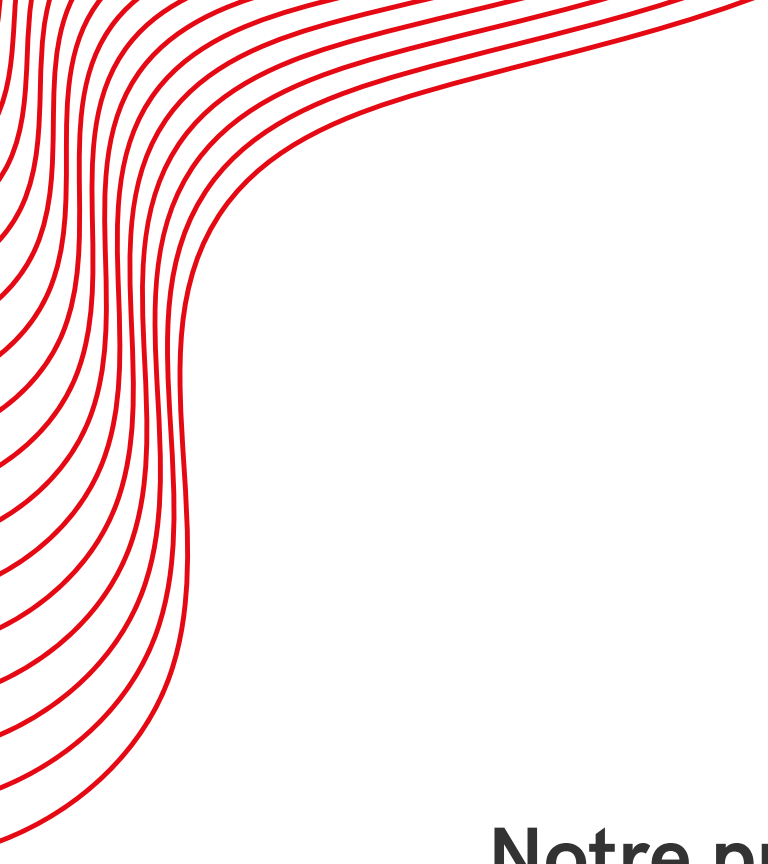

PARTIE GANTT

PHASES DU PROJET

Notre projet réalisé sur Gantt, a été segmenté selon les phases suivantes :

Phase 1: Analyse



Phase 2: Design UI



Phase 3: Dev Front

Phase 4: Dev Back



Phase 5: Test



Phase 6 : Déploiement



ANALYSE COMPARATIVE

Critère	Méthodes Classiques	Méthodes Agiles
Livraison du produit	Livraison unique en fin de projet.	Livraison progressive , avec fonctionnalités utilisables à chaque sprint .
Gestion du changement	Changements difficiles et coûteux à intégrer.	Changements intégrés naturellement , l'équipe s'adapte rapidement.
Relation avec le client	Client impliqué surtout en début et fin de projet .	Collaboration continue avec retours fréquents pour ajuster le produit.
Adaptabilité	Faible , difficile face aux besoins changeants.	Très adaptable , favorise l'innovation et l'évolution du produit



FONCTIONNALITÉS LIÉES À NOTRE SPÉCIALITÉ

Authentification renforcée (2FA)

Mise en place via un service d'envoi de codes.
ex: API email ou SMS

Gestion des rôles et permissions

Création d'une table rôles en base de données et utilisation de middleware

Chiffrement des données sensibles

hashage des mots de passe avec bcrypt/argon2 et utilisation de TLS pour sécuriser les communications.

Sécurisation des API


Authentification par tokens JWT, limitation du nombre de requêtes (rate limiting), et validation stricte des entrées

Journalisation des actions sensibles

journalisation des connexions et des actions critiques dans un système centralisé (ex. ELK stack), avec accès restreint aux administrateurs

Analyse des risques

Identifier les vulnérabilités majeures recensées par OWASP et appliquer les contre-mesures adaptées



AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

Détection d'activité suspecte en temps réel

- Connexion depuis une IP inhabituelle.
- Tentatives multiples de login échouées.(Exigé une authentification 2FA)

Anti-fraude sur paiements

- Vérifier la cohérence entre montant, localisation et historique de l'utilisateur.
- Bloquer ou mettre en attente les transactions suspectes.

Alertes proactives de sécurité

- En cas de tentative d'intrusion.
 - En cas de modification non autorisée des rôles.
 - En cas de détection d'activité suspecte.
- 



CONCLUSION

En conclusion, ce projet a confirmé que la méthode Agile est la solution idéale pour le développement d'une plateforme moderne comme Netflix. Elle assure une livraison progressive de la valeur métier et une forte adaptabilité aux besoins clients. Plus important encore, nous avons intégré la Cybersécurité dès la conception (2FA, chiffrement, anti-fraude), garantissant un produit non seulement fonctionnel, mais fondamentalement sécurisé et robuste.

